**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**
**Infraestrutura urbana e obras**
**Rua Quinze de novembro - 165 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01013-001**

**PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6022.2022/0004432-5,**
**TERMO DE CONTRATO Nº 183/SIURB/23**
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE CANALIZAÇÃO EM ADUELAS NA AVENIDA CABORÉ – JARDIM MARIA LIDIA, SÃO PAULO – SP.**

**REF: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO**

Prezados Senhores,

O **Consórcio Caboré**, inscrito no CNPJ nº 51.758.046.0001/05, por meio da empresa líder **Construtora Lettieri Cordaro LTDA**, com sede na **Av. Regente Feijó 944 – Sala 602a – Vila Regente Feijó – São Paulo/SP**., CNPJ **07.879.965.0001/45**, representada pelo Sr. Thiago Cordaro, que ao final subscreve, vem requerer de V.Sas., que sejam aditados **60 dias** no contrato nº 183/SIURB/23.

São Paulo, 29 de janeiro de 2025

**JUSTIFICATIVA TÉCNICA REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO N° 183/SIURB/23**

Vimos por meio deste, realizar a justificativa técnica referente ao aditamento de valor no contrato N° **183/SIURB/23**

**CRONOLOGIA:**

| |
|---|
| **CONTRATO 183/SIURB/23** |
| **ORDEM DE INÍCIO Nº 026/SIURB/OBRAS.G/2023 27/09/2023** |
| **TÉRMINO PREVISTO 27/04/2025** |

*Figura 1: Quadro síntese Contrato.*

**JUSTIFICATIVA ADITAMENTO:**

Em virtude de circunstâncias imprevistas que impactaram o andamento da obra, como as intensas chuvas registradas durante o período e o atraso no processo de desfazimento de cinco imóveis pela SEHAB, dos trechos 03 à 06, que estão alocados nas estacas de 03 à 17 na margem esquerda do rio, houve um impacto significativo no cronograma inicialmente estabelecido. As condições climáticas adversas resultaram no atraso das atividades no canteiro de obras e no fornecimento de materiais essenciais para a continuidade dos serviços, impossibilitando o cumprimento das etapas conforme o prazo previamente fixado.

Diante do exposto e considerando que os fatores que ocasionaram os atrasos estão alheios ao controle das partes envolvidas, torna-se imprescindível a concessão de um acréscimo no prazo para a conclusão da obra, a fim de compensar os atrasos causados pelas intempéries e pelo subsequente desabastecimento de materiais.

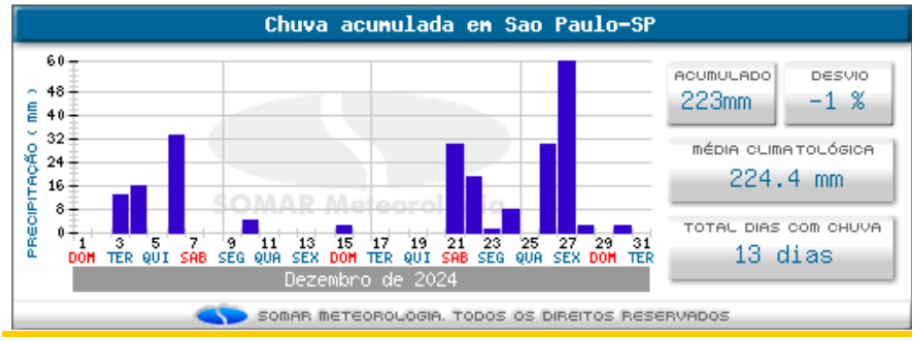


| Dados registrados no mês de Dezembro de 2024 em São Paulo-SP | | | |
|---|---|---|---|
| Dia | Temp. Min. | Temp. Máx. | Precipitação |
| 1 | 20.3 | 32.6 | 0 |
| 2 | 21.9 | 30.7 | 0 |
| 3 | 21.2 | 23 | 13 |
| 4 | 18.1 | 19.9 | 16 |
| 5 | 17 | 28.6 | 0 |
| 6 | 20.5 | 33 | 33.4 |
| 7 | 24.1 | 33.1 | 0 |
| 8 | 21.8 | 26 | 0 |
| 9 | 21.3 | 27.3 | 0 |
| 10 | 19.9 | 27.9 | 4.2 |
| 11 | 17.5 | 26.3 | 0 |
| 12 | 16.6 | 27.4 | 0 |
| 13 | 18.2 | 28 | 0 |
| 14 | 20 | 25.9 | 0 |
| 15 | 20.1 | 30 | 2.2 |
| 16 | 21.5 | 29.8 | 0 |
| 17 | 18.3 | 28.6 | 0 |
| 18 | 17.4 | 29.1 | 0 |
| 19 | 18.7 | 32.3 | 0 |
| 20 | 21.5 | 30.7 | 0 |
| 21 | 20 | 28.8 | 30.4 |
| 22 | 20.4 | 29 | 19.6 |
| 23 | 20.4 | 25.6 | 1 |
| 24 | 18.1 | 28.3 | 7.8 |
| 25 | 19.9 | 32 | 0 |
| 26 | 19.4 | 24.9 | 30.6 |
| 27 | 18.7 | 25.4 | 59.2 |
| 28 | 20.5 | 29.9 | 2.8 |
| 29 | 19.5 | 29.7 | 0 |
| 30 | 19 | 28.8 | 2.8 |
| 31 | 18.2 | 29.3 | 0 |
| | Média | Média | Total |
| | 19.7° C | 28.4° C | 223mm |

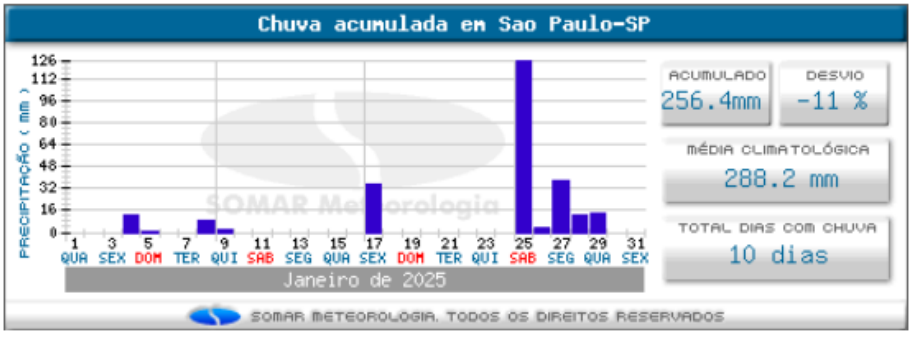

| Dados registrados no mês de Janeiro de 2025 em São Paulo-SP | | | |
|---|---|---|---|
| Dia | Temp. Min. | Temp. Máx. | Precipitação |
| 1 | 18.9 | 30.5 | 0 |
| 2 | 19.1 | 31 | 0 |
| 3 | 20.8 | 31.2 | 0 |
| 4 | 20.8 | 29.4 | 13.6 |
| 5 | 19.4 | 29.2 | 1 |
| 6 | 20.2 | 31.3 | 0 |
| 7 | 20.7 | 29.5 | 0 |
| 8 | 19.3 | 29.8 | 9.4 |
| 9 | 18.8 | 27.2 | 2.6 |
| 10 | 18.1 | 27.4 | 0 |
| 11 | 16.2 | 29.7 | 0 |
| 12 | 18.6 | 25.9 | 0 |
| 13 | 17 | 24.8 | 0 |
| 14 | 16.2 | 24.1 | 0 |
| 15 | 18.4 | 29.2 | 0 |
| 16 | 20.5 | 30.2 | 0 |
| 17 | 20.4 | 28.3 | 35.6 |
| 18 | 21.1 | 32.1 | 0 |
| 19 | 22.3 | | 0 |
| 24 | 21.5 | 32.6 | 0 |
| 25 | 20.3 | 33.2 | 125.6 |
| 26 | 21 | 30.7 | 3.4 |
| 27 | 20.5 | 27.3 | 38.2 |
| 28 | 19.4 | 28.6 | 12.8 |
| 29 | 20.9 | 26.2 | 14.2 |
| | Média | Média | Total |
| | 19.6° C | 29.1° C | 256.4mm |

Construtora Lettieri Cordaro Ltda
Rodrigo Cordaro
Sócio Diretor / Eng. Civil
RG: 32.900.879-1
CPF: 307.239.808-96
CREA-SP 5062490693

CONTRATADA
